


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Odsherred Varme A/S ønsker at etableres et forsyningsnet med tilslutning af Stårup by og ejendommene langs Stårupvej, Gammelgårdsvej og Højbyvej til det eksisterende fjernvarmeværk i Højby. I projektområdet er der 132 potentielle ejendomme, som kan tilkobles ledningsnettet. I forbindelse med projektet skal der ske konvertering af de enkelte husstandes eksisterende varmekilde, bl.a. olie, fast brændsel, el-varme og varmepumpe, til fjernvarme. Der er udarbejdet et varmeprojektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. I forbindelse med gennemførelsen af dette projekt, skal der ikke ske bygningsmæssige ændringer på det eksisterende varmeværk i Højby. Der vil ske enkelte optimeringer på det eksisterende pumpesystem for at fremtidssikre fremløbet af fjernvarme til hele distributionsområdet. Langs med ledningsnettet skal der etableres 1 boosterpumpe, som bliver etableret i et teknikskab, svarende til et større el-skab. Boosterpumpen er nødvendige for at opretholde trykket i systemet. Den endelige placering er endnu ikke fastlagt. Der skal ske grave- og ledningsarbejder i Stårup By samt i Stårupvej, Gammelgårdsvej og Højbyvej. Der skal etableres et ledningsnet fordelt på ca. 1,9 km transmissionsledning, ca. 2,4 km distributions- og stikledninger. Anlæggelsen af hele ledningsnettet kommer ikke til at ske samtidig, men vil blive inddelt i etaper. Erfaringsmæssigt vil der pr. arbejdsbold være mellem 50-200 m rørgrav ad gangen, hvorefter graven lukkes i de fleste tilfælde samme dag og arbejdet fortsætter på strækningen. Der vil i dette ledningsprojekt være flere arbejdsbold i gang ad gangen. Arbejdet vil blive tilrettelagt, så det skaber mindst muligt gene for afvikling af trafikken i byområderne, men der vil være strækninger, hvor det periodevis vil være nødvendigt med enten lysregulering eller ensretning af vejene og omdirigering af trafikken. Arbejdet forventes påbegyndt efteråret 2022 og afsluttet primo 2023. Projektet er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, som er vedlagt som bilag 1.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Odsherred Varme A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge Tlf.: 70 12 00 49 info@odsherredforsyning.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Projektchef Torben Kofoed Hovedgaden 39 4571 Grevinge Tlf.: 21 51 51 06 E-mail: tko@odsherredforsyning.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tinghulevej 8, 4573 Højby. Matrikel nr. 12fr Højby By, Højby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune.

Oversigtskort i målestok
eks. 1:50.000 – Målestok
angives. For havbrug
angives anlæggets
placering på et søkort.

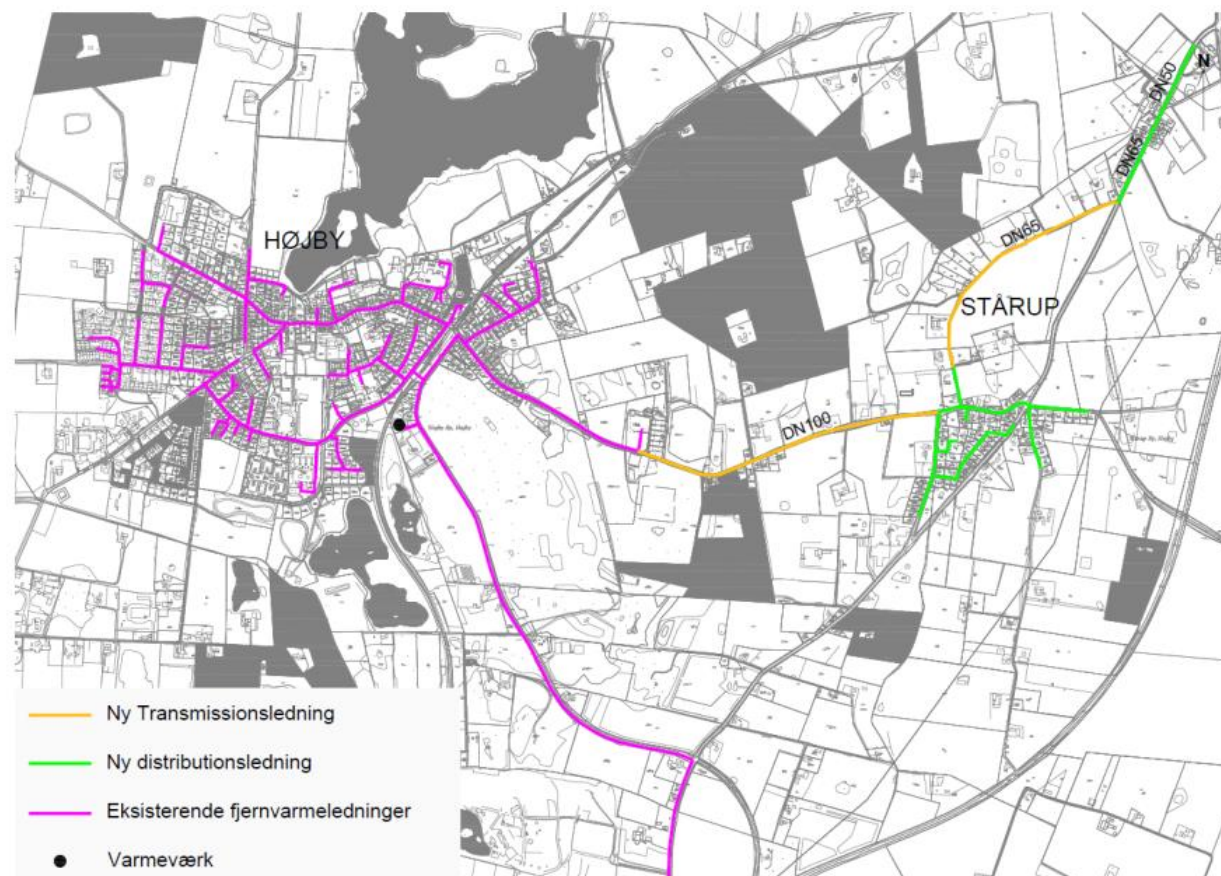

Målestok ca. 1:15.000 (vedlagt som bilag 2).

Kortbilag i målestok
1:10.000 eller 1:5.000
med indtegning af
anlægget og projektet
(vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg).

Forholdet til VVM
reglerne

Ja **Nej**

Er projektet opført på
bilag 1 til lov om
miljøvurdering af planer

X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

og programmer og konkrete projekter (VVM).			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 3b: Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matrikelejeren på transmissionsnettet er primært Odsherred Kommune da ledningsnettet primært etableres i offentlig vej. De områder, hvor der graves i privat fællesvej, er matrikelejeren en borger og/eller grundejerforeninger. I forbindelse med detailplanlægningen af anlægsarbejdet vil alle grundejere blive kontaktet.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Arealanvendelsen vil fortsat være den samme som den eksisterende, der hvor der etableres ledningsnet - det vil sige vej, cykelstier, opholdsarealer m.v.		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²	Der etableres ikke ny bebyggelse i forbindelse med projektet.		
Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Der etableres ikke nye befæstede arealer i projektet.		
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	-		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for grundvandssænkning. Det kan dog blive aktuelt, hvis detailprojekteringen af ledningsarbejdet viser, at grundvandsspejlet står højt i området. Hvis dette er tilfældet, vil der blive ansøgt specifikt om dette.		
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²	-		
Projektets bebyggede areal i m²	-		

Projektets nye befæstede-areal i m²	-
Projektets samlede bygningsmasse i m³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	-
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke ske nedrivning i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Til ledningsnettet vil der blive anvendt præfabrikerede fjernvarmerør, samlemuffer mv.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Opgravet jord i forbindelse med etablering af ledningsnettet, vil blive forsøgt genindbygget. Evt. overskudsjord, vil blive bortkørt i overensstemmelse med Odsherred Kommunes procedurer og retningslinjer. I alle ledningsgrave og omkring alle ledninger, skal der bruges sand, til at sikre ledningsnettet. Mængden af sand kendes ikke før den opgravede jords egnethed til genindbygning er vurderet, når gravearbejdet er i gang.
Vandmængde i anlægsperioden	Der skal bruges vand til toiletvogne for håndværkere i anlægsperioden.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Mængden af affald fra anlægsprojektet vil være begrænset. Affaldet håndteres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer og bekendtgørelser, samt Odsherred Kommunes forskrifter/regulativer for affaldshåndtering.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der vil kun blive udledt spildevand fra toiletfaciliteter svarende til antallet af håndværkere i anlægsperioden.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der vil ikke være direkte udledning af spildevand i anlægsperioden.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand vil nedsive i og omkring ledningstraceet.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Etablering af ledningsnettet påbegyndes efteråret 2022. Ledningsnettet idriftsættes primo 2023.
Projektets karakteristika	Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Det estimerede merforbrug af strøm på det eksisterende anlæg er 1.120 MWh/år. Ved 100% tilslutning til ledningsnettet, vil der skulle produceres 3.358 MWh/år yderligere på det eksisterende varmeværk. Der skal ikke anvendes råstoffer eller produkter, når projektet først er etableret. Når ledningsnettet er færdigetableret, men inden det sættes i drift, skal der tilføres vand til systemet svarende til anslået 16 m³ til ledningsnettet for at kunne sætte anlægget i drift. Der vil blive indgået aftale med vandværket om løbende påfyldning af anlægget. Alt vand skal blødgøres, før det tilføres anlægget. Dette vil ske i Højby varmeværks eksisterende blødgøringsanlæg. I driftsfasen skal der som udgangspunkt ikke tilføres vand til systemet. Det vil kun være ved brud på ledningsnettet, at der skal tilføres yderligere vand.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres ikke farligt affald fra ledningsnettet i driftsfasen. Der vil kun forekomme affald i driftsfasen i tilfælde af ledningsbrud eller øvrige reparationer. Det vil blive håndteret i overensstemmelse med kommunens anvisning og regulativer. Der produceres ikke spildevand fra ledningsnettet. Der vil ikke ske direkte afledning af spildevand. Håndtering af regnvand vil fortsætte som eksisterende.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet omfatter ikke selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Projektet er ikke omfattet af standardvilkår.

standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. <i>Ikke relevant for nærværende projekt.</i>
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. <i>Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.</i>
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. <i>Ikke relevant for nærværende projekt.</i>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. <i>Anlægget er ikke omfattet af BAT-konklusioner.</i>
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. <i>Ikke relevant for nærværende projekt.</i>
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. <i>Ikke relevant, da der udelukkende er tale om en udvidelse af eksisterende ledningsnet.</i>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen <i>Anlægsarbejder vil følge Odsherred Kommunes retningslinjer på dette område.</i>
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen <i>Ledningsnettet vil ikke give anledning til støj eller vibrationer efter det er etableret.</i>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Der etableres ikke udsug eller skorsten.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Bygge og anlægsarbejder vil følge Odsherred Kommunes retningslinjer på dette område.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der vil ikke blive afgivet emissioner til omgivelserne, når anlægsarbejdet er udført.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. X Projektet vil ikke give anledning til støvgener udover almindeligt anlægsarbejde.
I driftsfasen?		X	X I driftsfasen, vil der ikke være aktiviteter forbundet med ledningsnettet, som kan give anledning til støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. X Der vil ikke være lugtgener ifm. anlægs- og driftsfasen af ledningsnettet. X
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. X Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne. X Der vil ikke blive opsat lys i forbindelse med ledningsnettet.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige		X	Der skal ikke tilføres produkter eller stoffer til ledningsnettet, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.

stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Størstedelen af projektområdet er beliggende i landzone. Der er et mindre boligområde i Stårup, hvor der er udarbejdet en lokalplan (lokalplan 2007-09). I lokalplanen står der at ejendommene skal have individuel opvarmning. Der er i lokalplanens bestemmelser ikke taget stilling til varmeforsyning af lokalplanområdet.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Ledningsnettet vil passere forbi nogle fortidsminder, som fremgår af bilag 3, punkt 1. Der vil ikke blive gravet eller anlagt ledninger indenfor beskyttelseszonen på to meter, i henhold til museumsloven, rundt om fortidsminderne. Ved to af fortidsminder skal der i detailplanlægningen tages hensyn til beskyttelseszonen på 100 meter fra fortidsmindet, i henhold til naturbeskyttelsesloven §18. Hvis det ikke er muligt at lægge ledningerne uden for beskyttelseszonen, vil der blive ansøgt om dispensation, arbejdet vil blive tilrettelagt så der tages størst muligt hensyn til fredningen. - Syvhøje: Rundhøj fra oldtiden (fredningsnummer: 282417). - Brodbjærg: Brandgrav (uspecificeret type) og rundhøj fra oldtiden (fredningsnummer: 282430). Syvhøje er også udpeget til kulturarvsareal med regional betydning. Ifølge fredningsbeskrivelsen vil der i området kunne være andre spor af neolitiske aktiviteter. Fredningen beskytter højene og langdyssen i området. Af bilag 3, punkt 2 fremgår de områder, som er beskyttet af kirkebyggelinjer omkring de lokale kirker. Der er ingen kirkebyggelinjer i nærheden af projektområdet. Nærmeste kirkebyggelinje er i Højby ca. 1 km fra nærmeste ledningstrace.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Fjernvarmerørene vil som udgangspunkt blive etableret i offentlige arealer, som vej, fortov eller cykelsti. Varmeværket vil ikke begrænse brug af naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der er ikke udlagt råstofområder eller råstofinteresseområder inden for hele projektområdet, se bilag 3, punkt 3.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Størstedelen af projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen, se bilag 2, punkt 3. Der skal i disse områder kun etableres ledningsnet, og kun et mindre teknikskur oven på jorden.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og		X	Projektet medfører ikke rydning af skov. Der er ikke registreret fredskov inden for projektområdet, se bilag 2, punkt 5.

arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Der er ingen rejste fredninger i nærheden af projektområdet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ledningsnettet kommer til at passere en del forskellige naturtyper beskyttet af naturbeskyttelsesloven. De fremgår af bilag 3, punkt 6. Der skal i forbindelse med arbejdet ikke krydses nogen naturbeskyttede områder, og der er ingen af søerne, hvor ledningsnettet skal lægges inden for 2 meter til søens kronekant.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		I de naturbeskyttede områder, som ledningsnettet skal løbe langs med, som beskrevet ovenfor, er der registreret beskyttede arter. De registrerede områder fremgår af bilag 2, punkt 7. Der er fundet bilag IV-arter (spidssnudet frø, stor vandsalamander 2010-2017) i og omkring en sø mere end 250 m fra ledningstraceets nordligste ende. Det vurderes ikke, at ledningsarbejdet vil påvirke eventuelle levesteder for de beskyttede arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Af bilag 3, punkt 8 fremgår hvilke beskyttede sten- og jorddiger, som er i områderne omkring ledningsnettet. Fælles for alle passagerne er, at digerne allerede er gennembrudt af det eksisterende vejtrace. Ledningsnettet vil blive placeret i eksisterende vej eller cykelsti, og vil så vidt det er muligt, blive placeret i eksisterende gennembrud af diget. Hvis ikke dette er muligt, vil der blive ansøgt om rørlægning under diget i henhold til museumsloven. Af bilag 3, punkt 9 fremgår det fredede område i nærheden af ledningstraceet. Det er arealfredninger Nygård, som ledningsnettet kommer til at løbe langs med. Området er fredet for at sikre udsigten, og området må derfor ikke bebygges. Da der kun skal gennemføres gravearbejder i vejen langs med fredningen, og da området reetableres igen, vurderes ledningsarbejdet ikke at være omfattet af arealfredningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstanden fra ledningsnettet til de internationale naturbeskyttelsesområder varierer, men nærmeste område er Natura 2000 – Fuglebeskyttelsesområde: Hov Vig (ca. 2,7 km mod øst), Natura 2000 – Habitatområder: Annebjerg Skov og Ulkerup Skov (ca. 1,4 km mod sydøst) og Ramsar områder: Sejro Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig (ca. 5,5 km mod vest), som også er habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Natura2000 områdets placering fremgår af bilag 2, punkt 10.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Hele projektområdet ligger inden for området med drikkevandsinteresse. Den vestligste del af ledningsnettet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse, og fremgår af bilag 3, punkt 11. Etableringen af fjernvarmerørene sker i lukkede rørsystemer, sådan at det ikke er muligt for vand at trække ind eller ud af rørføringerne. Hvis der under etableringen af ledningstraceerne viser sig helt lokale forhold, som gør at de fremtidige ledningstraceer kan påvirke det terrænnære overfladevands bevægelse til og fra vådområderne, vil der blive udarbejdet en alternativ plan for fx opfyldning af ledningsgraven i dette område.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Der er to V1 kortlagte grunde i området, hvor der skal etableres ledningsnet. Kortlægningernes placering fremgår af bilag 3, punkt 13. Ledningsnettet vil blive anlagt, så der som udgangspunkt ikke skal laves gravearbejde i de kortlagte områder. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil der blive ansøgt om tilladelse efter jordforureningsloven til dette gravearbejde.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Projektområdet er ikke udpeget som område med risiko for oversvømmelse ifølge Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune (2014).
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Området er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er ikke andre eller lignende aktiviteter i området. Der er ikke kendskab til planlagte større ledningsarbejder på hele ledningstraceet samtidig med dette anlægsarbejde.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Påvirkningen af projektet er helt lokal.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse			

eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	
---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
